

**Comisión Alto Nivel (CAN) para la ejecución del
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico
Norte) PIAAG
Minuta No. 02-2017**

Fecha: 20 de junio de 2017

Hora: 09 – 11 horas – Sala Yolanda Oreamuno Casa Presidencial

Asistentes Miembros Comisión Alto Nivel:

Sr. Edgar Gutierrez E. Ministro de MINAE
Sra. Olga Marta Ministra MIDEPLAN
Sr. Luis Felipe Arauz Ministro MAG
Sra. María Ester Anchia Viceministra Salud
Sr. Luis Paulino Mora Viceministro Presidencia
Sr. Fernando Mora Viceministro Agua, Mares, Costas y Humedales
Sra. Patricia Quiros Gerente SENARA
Sra. Yamileth Astorga Presidente Ejecutiva AyA
Sr. Julio C. Espinoza Director de Crédito Público de Ministerio
Hacienda

Ausencias Justificadas:

Sr. Carlos Obregón Presidente Ejecutivo ICE

Asistentes de apoyo y asesoría:

Srta. Vicky Cajiao SEPLASA
Sr. Jose Miguel Zeledón Director Agua MINAE

Invitados especiales:

Sr. Carmen Granados F. Ministerio de la Presidencia
Sr. Marvin Coto SENARA
Sr. Kermith Carvajal UE ICE
Sra. Rossy Trigueros Crédito Público de Ministerio Hacienda
Sra. Nathalie Montiel AyA
Sr. Alexander León Director ACAT
Sr. Mainor Cárdenas ACAT
Sr. Manrique Montes ACAT
Sr. Maikel Sosa SENARA

Temas tratados:

1. Revisión de Acuerdos

2. Estado y proyección Proyecto Acueducto Sardinal-Coco-Ocotol (20 minutos AyA)
3. Estado y proyección Proyecto PAACUME (SENARA 30 minutos)
4. Informe avance de estructuración préstamo para PAACUME- (Crédito Publico. 10 minutos)
5. Varios

CONTROL DE ACUERDOS PENDIENTES

1. SENARA e ICE sondea posibilidad de que el ICE ejecute los avalúos en sede administrativa y judicial de las expropiaciones de los propietarios de terrenos margen derecha.

ESTADO: Atendido está en proceso

2. El AyA presentará la condición de emergencia que se visualiza en el abastecimiento de agua en el Coco por riesgo de salinización ante la Junta Directiva de la CNE para ser incluido dentro del Plan de Emergencia respectivo.

ESTADO: PENDIENTE

3. La Secretaria Técnica debe trabajar en el desarrollo de un Plan Maestro de Abastecimiento de agua para Guanacaste que incluya el tema de la demanda de agua de largo plazo.

ESTADO: PENDIENTE. DESCARTADAS OPCIONES DE FINANCIAMIENTO CON JICA, GIZ. SE COORDINA REUNION SON BID Sra. Silvia Ortiz

4. Se le solicita al Sr. Ministro de MINAE Don Edgar Gutiérrez E. en calidad de coordinador de la Comisión de Alto Nivel formalizar solicitud de presentación y aprobación al Consejo Regional de Área de Conservación de Arenal Tempisque y al Consejo Nacional de Áreas de Conservación, del estudio Establecimiento de la línea base de biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal (RBLB) y la propuesta de área a desafectar con las áreas de compensación.

ESTADO: Se espera presentar en próximo mes de julio de 2017

5. Proyecto de ley para la desafectación y compensación del área afecta de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Será realizado por el MINAE con los insumos que remite SENARA.

ESTADO: Se tiene borrador de texto con la motivación, falta integrar los artículos de los derroteros del área de desafectar y las áreas de

compensación. Se dispone por el Sr. Ministro que sea presentado en los primeros días de julio a la aprobación del CORAC y CONAC.

2.- Avance de proyectos Acueducto Sardinal – El Coco - Ocotal

Se informa que la prueba de bombeo de inicia es este mes de junio y se tiene prevista conferencia de prensa el 21 de junio de 2017 en Guanacaste para ello, donde estará la Secretaria técnica y personal de AyA.

Se manifiesta que se mantiene el proceso sistemático con miembros de la comunidad con reunión mensuales para trabajar en el Plan de Manejo del Acuífero.

Se aprobó por la Junta Directiva del AyA la carta de entendimiento de finiquito con el Fidecomiso.

El Ministro indica que cualquier actividad o acuerdos en relación al proyecto debe ser tomados en el seno de la Comisión de Alto Nivel y participar de las reuniones y actividades a la Secretaria Técnica.

3. Informe de avance de Paacume

Presentado por personal de SENARA y de la Unidad Ejecutora del ICE según laminas siguientes:




Avance Trabajos


Elaboración de Diseños & EsIA

Junio 2017

Estudio Impacto Ambiental


- Actividades
 - Se finalizó el 100 % de las actividades asociadas a la Línea Base
 - Se trabaja en la elaboración del documento final
 - Se inicia segunda etapa del proceso de comunicación



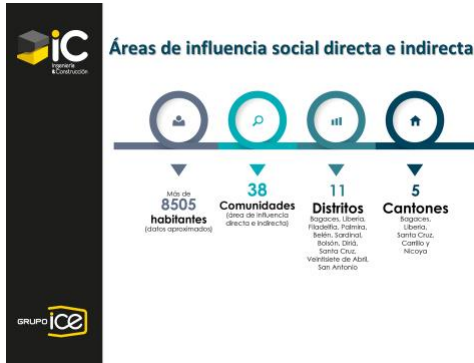


Convocatoria

- Invitaciones personalizadas.
- Notas personalizadas.
- Campaña radial.
- Perifoneo.
- Afiches.
- Volantes.
- Mantas.

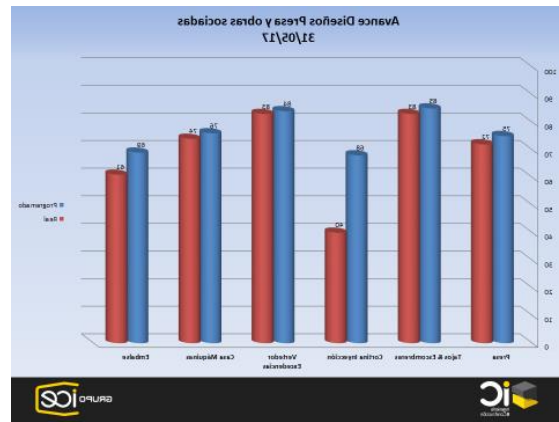

AVANCE DE OBRAS



Otros trabajos

- Conforme se ha avanzado con los trabajos se ha visto la necesidad de realizar algunas actividades que no estaban consideradas en el contrato original y deberán ser incluidas mediante una nueva adenda:
 - 100 m de Excavación Adicionales para **Tajos**
 - Replanteamiento de lindero entre el canal y las propiedades de RBLB
 - Inventario Forestal tramos II y III del Canal Oeste
 - Elaboración del EslA para el sitio de cantera conocido como "**Tajo La Isla**"

El presupuesto será aportado por el SENARA



Posible Inicio Constructivo

- Presupuesto: Se asignaron ¢ 3000 millones dentro del presupuesto extraordinario del 2017. **¿Cuándo estarían disponibles?**
- Mediante el oficio **SG-ASA-0128-2017** la SETENA aprueba los trabajos a desarrollar en el tramo II del Canal Oeste.
- El 06/06/2017 se recibió la información técnica por parte del SENARA para estimar los costos asociados e incorporarlos en el contrato de construcción.
- Se espera revisar el contrato con el SENARA para definir fecha de firma y esperar orden de inicio.



Mapa de Ubicación Tajo La Isla

Simbología

- Perforaciones_Tajos
- Tajo_La_Isla
- Laves
- Agüinobras
- Area de influencia Directa
- Area de influencia indirecta

CANTERA LA ISLA
(DISTRITO BAGACES, CANTON BAGACES)

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CUENCA MEDIA DEL RIO TEMPISQUE Y COMUNIDADES COSTERAS

MAYO, 2017



Se presenta video sobre Paacume, el cual se le hace comentarios positivos y se acuerdas que debe mejorarse en los siguientes aspectos:

Se debe hacer mención al PIAAG donde la institucionalidad sea visualizada
Cambiar la mención de acuíferos sobreexplotados, pues no resulta certero, cambiar por disminuir la presión sobre las aguas subterráneas costeras.
Ajustar el área final de riego antes y después del proyecto.

Se informa por parte de SENARA que, si bien se tiene aprobados en presupuesto nacional extraordinario 3000 millones para el desarrollo de la ampliación del canal del oeste en 21 kilómetros, el costo total es de 16800 millones. Por lo cual para firmar contrato con el ICE para su ejecución y que sería por la totalidad se requiere el compromiso del Ministerio de Hacienda de los restantes 13800 millones. Y además se debe autorizar el levantamiento del límite de gasto.

ACUERDOS

1. Presentar por parte del Ministro al CORAC y CONAC a su conocimiento y aprobación el estudio *Establecimiento de la línea base de biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal (RBLB) y finca adyacente* elaborado por la Organización Para los Estudios Tropicales –OET-.
2. Secretaria Técnica con personal del SINAC, del Área de Conservación Arenal Tempisque, SENARA y Vicky Cajiao deben evaluar el estado de requisitos, para gestionar oportunamente los que correspondan además de definir la ruta a seguir para tener el texto de Ley de desafectación de Lomas de Barbudal, que debe estar presentado en julio en la Asamblea Legislativa.
3. SENARA enviara oficio al Ministro de MINAE sobre la justificación de necesidad de que Hacienda presupueste la suma de 13800 millones de colones restantes como respaldo para poder firmar contrato con el ICE de la ampliación y mejora del sector de canal del oeste.

Minuta levantada por José Miguel Zeledón Calderón
