

**Comisión Alto Nivel (CAN) para la ejecución del
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico
Norte) PIAAG
Minuta No. 01-2018**

Fecha: 21 de febrero de 2018
Hora: 09 – 11:00 horas – Sala Piso 10 MINAE

Asistentes Miembros Comisión Alto Nivel:

Sr. Edgar Gutierrez E. Ministro de MINAE
Sra. Olga Martha Sánchez Ministra MIDEPLAN
Sra. Laura Velézquez Ministerio Salud
Sra. Patricia Quiros Gerente SENARA
Sra. Yamileth Astorga E. Presidente Ejecutivo AyA
Sr. Felipe Arguedas Viceministro MAG
Sr. Julio Espinoza Dirección Crédito Público - Hacienda
Sr. Luis Pacheco ICE

Asistentes de apoyo y asesoría:

Sr. Jose Miguel Zeledón Director Agua MINAE
Sr. Roberto Villalobos Sub Director IMN

Invitados especiales:

Sr. Marvin Coto SENARA
Sr. Kermith Carvajal UE ICE
Sra. María José Vega Crédito Público
Sra. Susan García Hacienda
Sr. Leonardo Cascante Dirección de Agua

Temas tratados:

1. Control de Acuerdos
2. Informe de Avance de Proyectos AyA, **presentado por AyA**
3. Informe de Avance de PAACUME: Énfasis en estado puntos críticos (Ley de Desafectación/compensación RBLB - EIA - estructuración de préstamo con BCIE - contrato SENARA-ICE para iniciar obra) presentado por SENARA en coordinación con Dirección de Crédito Público en lo que corresponda.
4. Informe del CAN de cierre y entrega del PIAAG a nuevo Gobierno y COREDES. Presentado por Secretaría Técnica.

5. Recibir personal de MIDEPLAN sobre Evaluación Estratégica que se le realiza al Piaag. **Presentado por personal de MIDEPLAN**
6. Varios

CONTROL DE ACUERDOS

1. SENARA y ICE sondea posibilidad de que el ICE ejecute los avalúos en sede administrativa y judicial de las expropiaciones de los propietarios de terrenos margen derecha.

ESTADO: CUMPLIDO. SENARA lo realiza conforme contratación de abogados.

2. La Secretaria Técnica debe trabajar en el desarrollo de un Plan Maestro de Abastecimiento de agua para Guanacaste que incluya el tema de la demanda de agua de largo plazo.

ESTADO: CUMPLIDO. Será financiado con Fondos de Pre inversión de MIDEPLAN. Propuesta revisada y retroalimentada por MIDEPLAN. Solicitud se formaliza la primera semana de octubre. Actualmente esta en MIDEPLAN

NO HAY ACUERDOS PENDIENTES

1. Informe de avance proyectos AyA

Se informa que todos los proyectos se trabajan conforme lo dispone la Matriz del PIAAG.

En relación a acciones específicas presentadas, en casos como el proyecto Cañas-Bebedero esta pendiente respuesta de Tributación Directa sobre exoneración de impuestos. En el caso de Acueducto de Bagaces sobre la fuente está en curso pendiente respuesta del Area Conservación Tempisque sobre la condición de un humedal o no.

En el caso de Cóbano hay un inconveniente sobre el tema de servidumbre.

2. PAACUME:

Se informa de la cantidad importante de mociones que presento la Diputa Suray Carillo al proyecto de Ley N°20.465 “Ley para la modificación de límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de agua para la cuenca media del río Tempisque y comunidades costeras”, entre 60-80 mociones de forma.

El Sr. Ministro MINAE conversará con la Diputada Suray Carrillo, además con la Diputada Martha Arauz con el fin de ver el avance de dictamen del proyecto de Ley.

Se informe por SENARA que el día 23 de marzo de 2018 está convocada la Diputada Carrillo para realizarle una presentación de PAACUME y buscar su consenso con el proyecto.

Se debe trabajar en el decreto de conveniencia nacional para el tema de bosque, pero para ello se requiere el sustento técnico, por lo cual no podría salir en este gobierno.

Está pendiente que el Ministro de Hacienda emita oficio que oficialice la habilitación la negociación con el BCIE del préstamo.

En esto el Ministro MINAE indica que consultara a Don Helio Fallas.

En relación a la opción de que el ICE pueda ser contratado para realizar las obras de PAACUME, se debe considerar que para el BCIE debe existir un proceso abierto de contratación y sería una de las condiciones del préstamo y consecuente en la Ley de aprobación del préstamo.

En relación a los 3000 millones de colones que están el presupuesto extraordinario para PAACUME, se indica por SENARA que será usado en la compra de tierra para la ampliación del canal oeste y la presa.

Presentar por parte del ICE y SENARA al SINAC solicitud de corta de árboles para el desarrollo de la ampliación del canal del oeste.

3. Informe del CAN de cierre y entrega del PIAAG a nuevo Gobierno y COREDES.

Acuerdo

Presentar y entregar el estado de PIAAG a COREDES ampliado. Se delega en la Sr. Ministra de MIDEPLAN la coordinación al respecto, para definir fecha y la logística y que la actividad se coordine con el Secretario técnico del CAN –PIAAG.

4. Evaluación Estratégica que se le realiza al PIAAG.

Compañeros de MIDEPLAN y de la Dirección de Agua realizan la presentación sobre los términos de referencia para la contratación de servicio profesionales para la evaluación estratégica del PIAAG en los temas de gobernanza y comunicación.

El Sr. Ministro MINAE hace la observación que sea evaluado con visión de sector y para ello se incluya SEPLASA.

Se integra a la minuta la presentación.



Presentación de Términos de Referencia
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (PIAAG)



Unidad de Evaluación
Área de Evaluación y Seguimiento
MIDEPLAN

Agenda Nacional de Evaluación (ANE) 2015 -2018


Una de las intervenciones públicas con carácter estratégico para el Gobierno para ser evaluadas durante este periodo, es el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (PIAAG) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), bajo la rectoría del Sector Ambiente y Energía.



mideplan

Evaluación PIAAG


La decisión de evaluar al PIAAG, se desprende de un interés de la Dirección de Agua (DA) en analizar el diseño y la gestión del programa (procesos coordinación y comunicación) con el fin de generar acciones de mejoras y promover el aprendizaje organizacional.



mideplan

Evaluación PIAAG

El proceso en el que se enmarca la evaluación se estructura en cuatro etapas, conectadas entre sí:



Preparación	Diseño	Ejecución	Uso
<ul style="list-style-type: none"> Identificación de necesidades Selección del equipo y justificación Identificación de actores Análisis de viabilidad 	<ul style="list-style-type: none"> Definición clara de intervenciones Composición de equipos y asignación de responsabilidades Elaboración de planes Elaboración de TIR y selección de indicadores 	<ul style="list-style-type: none"> Análisis del Plan de Trabajo Implementación del equipo de trabajo Monitoreo de avances Ejecución de resultados 	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de documentaciones Elaboración del Plan de Acción Implementación del Plan de Acción Definición de acciones del Plan de Acción

mideplan

Objetivos de la Evaluación del PIAAG



Objetivo general

Evaluar los procesos de coordinación y comunicación implementados por el PIAAG, para el fortalecimiento de la gobernanza de dicho programa.

imideplan

Objetivos de la Evaluación del PIAAG

Objetivos específicos

- Valorar la Teoría de Intervención del PIAAG
- Valorar los procesos de coordinación y comunicación del PIAAG, a nivel de pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad.
- Determinar los factores que inciden en fortalecimiento de la gobernanza del PIAAG.

imideplan


Preguntas de la Evaluación del PIAAG



- Detalle y adecuación de la teoría de la intervención del PIAAG.
- Nivel de pertinencia de los procesos con las necesidades de la población, el contexto político-institucional y los objetivos del PIAAG.
- Factores que inciden en la gobernanza del PIAAG desde el punto de vista de todos los actores.

imideplan

Preguntas de la Evaluación del PIAAG



- Grado de efectividad de los procesos para:
 - la participación y generación del PIAAG por parte de los actores;
 - coordinación de los intereses entre los actores;
 - la cohesión en la gestión realizada por las instituciones públicas.
- Grado de eficacia del proceso de coordinación para:
 - coordinación de los actores;
 - aplicación de propuestas del sector público en la zona III;
 - actividades de supervisión y control de cuentas.

imideplan

Características de la Evaluación

Funcionalidad	Contenido	Momento	¿Quién evalúa?
Formativa	Diseño Procesos	Durante	Externa

imideplan

Alcance de la Evaluación




- Unidad de estudio: Colectivos relacionados con procesos de coordinación y comunicación.
- Alcance Geográfico: Zona Pacifico Norte.
- Alcance Temporal: del 2015 al 2017.
- Ejes de acción:
 - Seguridad pública para las comunidades.
 - Seguridad alimentaria.

imideplan

Instancias participantes de la Evaluación

Instancia	Rol
MIDEPLAN	Este promotor, orientador, gestor del proceso de evaluación y financiador de la evaluación. Su interés central es garantizar la credibilidad y rigurosidad de la evaluación.
MINAE	Este ejecutor de la intervención, solicitante del proceso de evaluación. Su interés principal es la identificación de insumos sustantivos para respaldar la toma de decisiones.
Equipo Técnico	Equipo técnico encargado de preparar, programar, gestionar y supervisar el desarrollo del proceso de evaluación y asegurar su conclusión.
Equipo Directivo	Equipo encargado de la orientación estratégica y toma de decisiones del proceso de evaluación.

mideplan

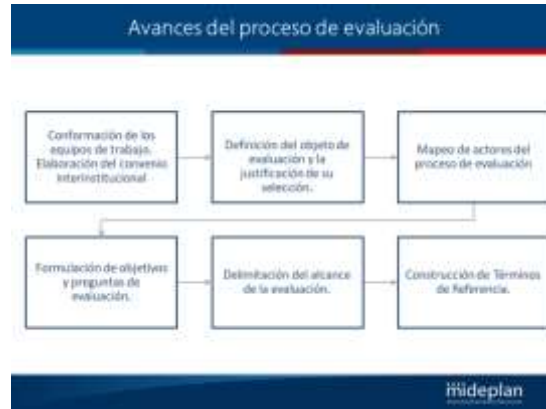

Próximos pasos

Acciones centrales	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Definición y divulgación de Términos de Referencia.				
Recepción de ofertas técnicas y financieras.				
Selección de oferta				
Contratación para la ejecución de la evaluación				
Sesión de retroalimentación (con autoridades)				
Ejecución de evaluación (3 meses)				
Presentación de resultados	Septiembre 2018			
Elaboración Plan de Acción	Octubre 2018			

mideplan

Minuta levantada por José Miguel Zeledón Calderón
